N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**FOURS**	**126,41 sm**	**Jeu 15/01/15**	**Mar 23/05/17**	
2		Commande Fours	0 jour	Jeu 15/01/15	Jeu 15/01/15	
3		***PAM***	**116,09 sm**	**Mer 25/02/15**	**Lun 24/04/17**	
4		Plans guide GC et descentes de charges	0 jour	Mer 25/02/15	Mer 25/02/15	2FD+6 sm
5		Plan final GC	0 jour	Jeu 16/04/15	Jeu 16/04/15	2FD+3 mois
6		Engenierie ,fabrication ,livraison	240 jours	Ven 17/04/15	Jeu 17/03/16	5
7		Montage	8 mois	Ven 18/03/16	Ven 18/11/16	6;53
8		tests a froid	2 mois	Lun 21/11/16	Jeu 19/01/17	7
9		**Besoin de puissance Electrique**	0 sm	Ven 18/11/16	Ven 18/11/16	7
10		test à chaud	1 mois	Ven 20/01/17	Lun 20/02/17	8
11		Premier lingot	1 jour	Mar 21/02/17	Mar 21/02/17	10
12		Performance tests	2 mois	Mer 22/02/17	Lun 24/04/17	11
13		***VAR 1***	**126,41 sm**	**Jeu 15/01/15**	**Mar 23/05/17**	
14		Commande VAR	0 sm	Jeu 15/01/15	Jeu 15/01/15	2
15		Plan guide GC	0 sm	Mer 25/02/15	Mer 25/02/15	14FD+6 sm

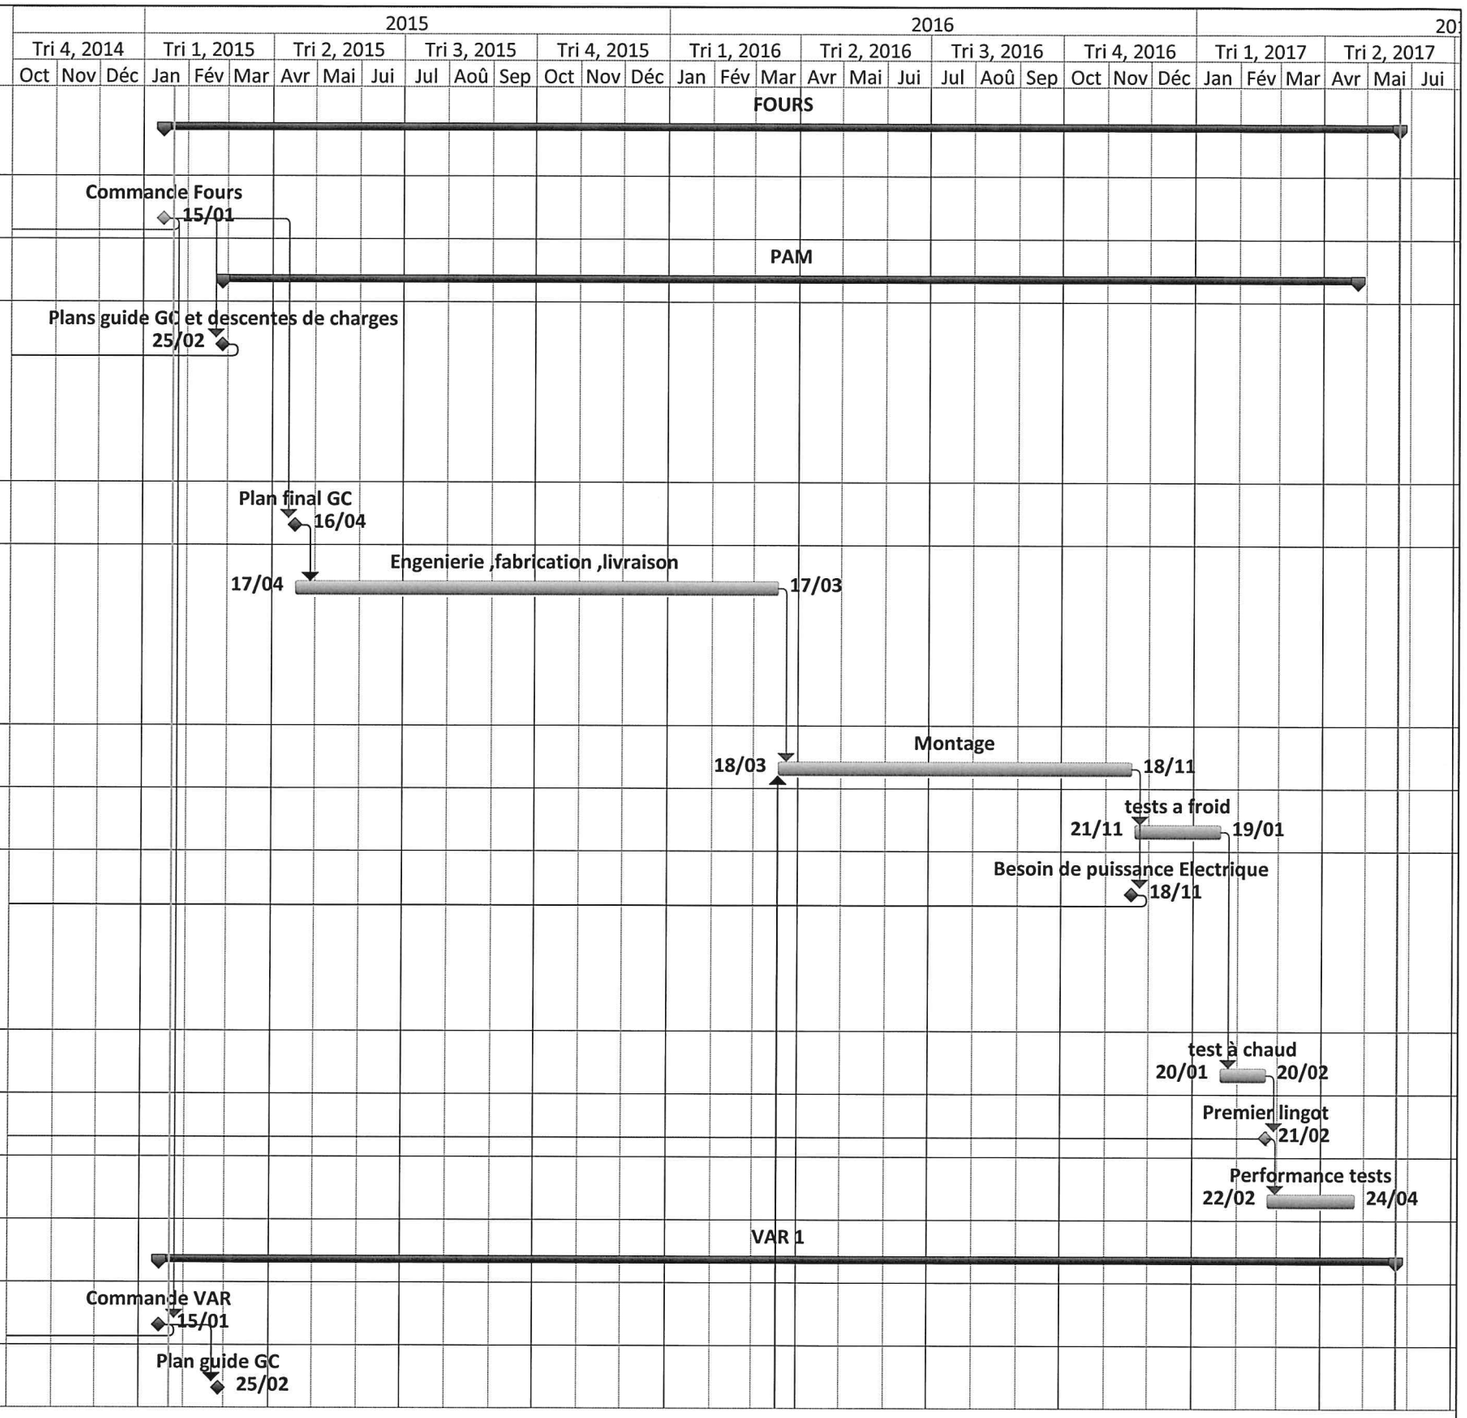

Projet : Projet EcoTitanium avec r
Date : Jeu 22/01/15

Tâche		Tâches externes		Tâche manuelle		Fin uniquement	
Fractionnement		Jalons externes		Durée uniquement		Échéance	
Jalon		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulative		Jalon inactif		Récapitulatif manuel			
Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Début uniquement			

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
16		Pan GC final	0 sm	Jeu 16/04/15	Jeu 16/04/15	14FD+3 mois
17		Engenierie ,fabrication ,livraison	262 jours	Jeu 19/11/15	Ven 18/11/16	14FD+10 mois
18		Montage	2 mois	Lun 21/11/16	Jeu 19/01/17	17;53
19		Tests à Froid	1 mois	Ven 20/01/17	Lun 20/02/17	18
20		**Besoin de puissance Electrique**	0 sm	Jeu 19/01/17	Jeu 19/01/17	18
21		Tests à Chaud	1 mois	Mar 21/02/17	Mer 22/03/17	19
22		Performance tests	2 mois	Jeu 23/03/17	Mar 23/05/17	11DD+2 sm;21
23						
24		**Batiments**	**93,24 sm**	**Mer 25/02/15**	**Ven 18/11/16**	
25		***Terrassement VRD***	**23,06 sm**	**Lun 27/04/15**	**Mer 30/09/15**	
26		Commande Terrassemenr VRD	0 jour	Lun 27/04/15	Lun 27/04/15	2FD+15 sm
27		Tx préparatoires/installa chantier	5 jours	Mer 27/05/15	Mer 03/06/15	26FD+1 mois
28		Travaux de terrassement	70 jours	Mer 03/06/15	Mer 09/09/15	27

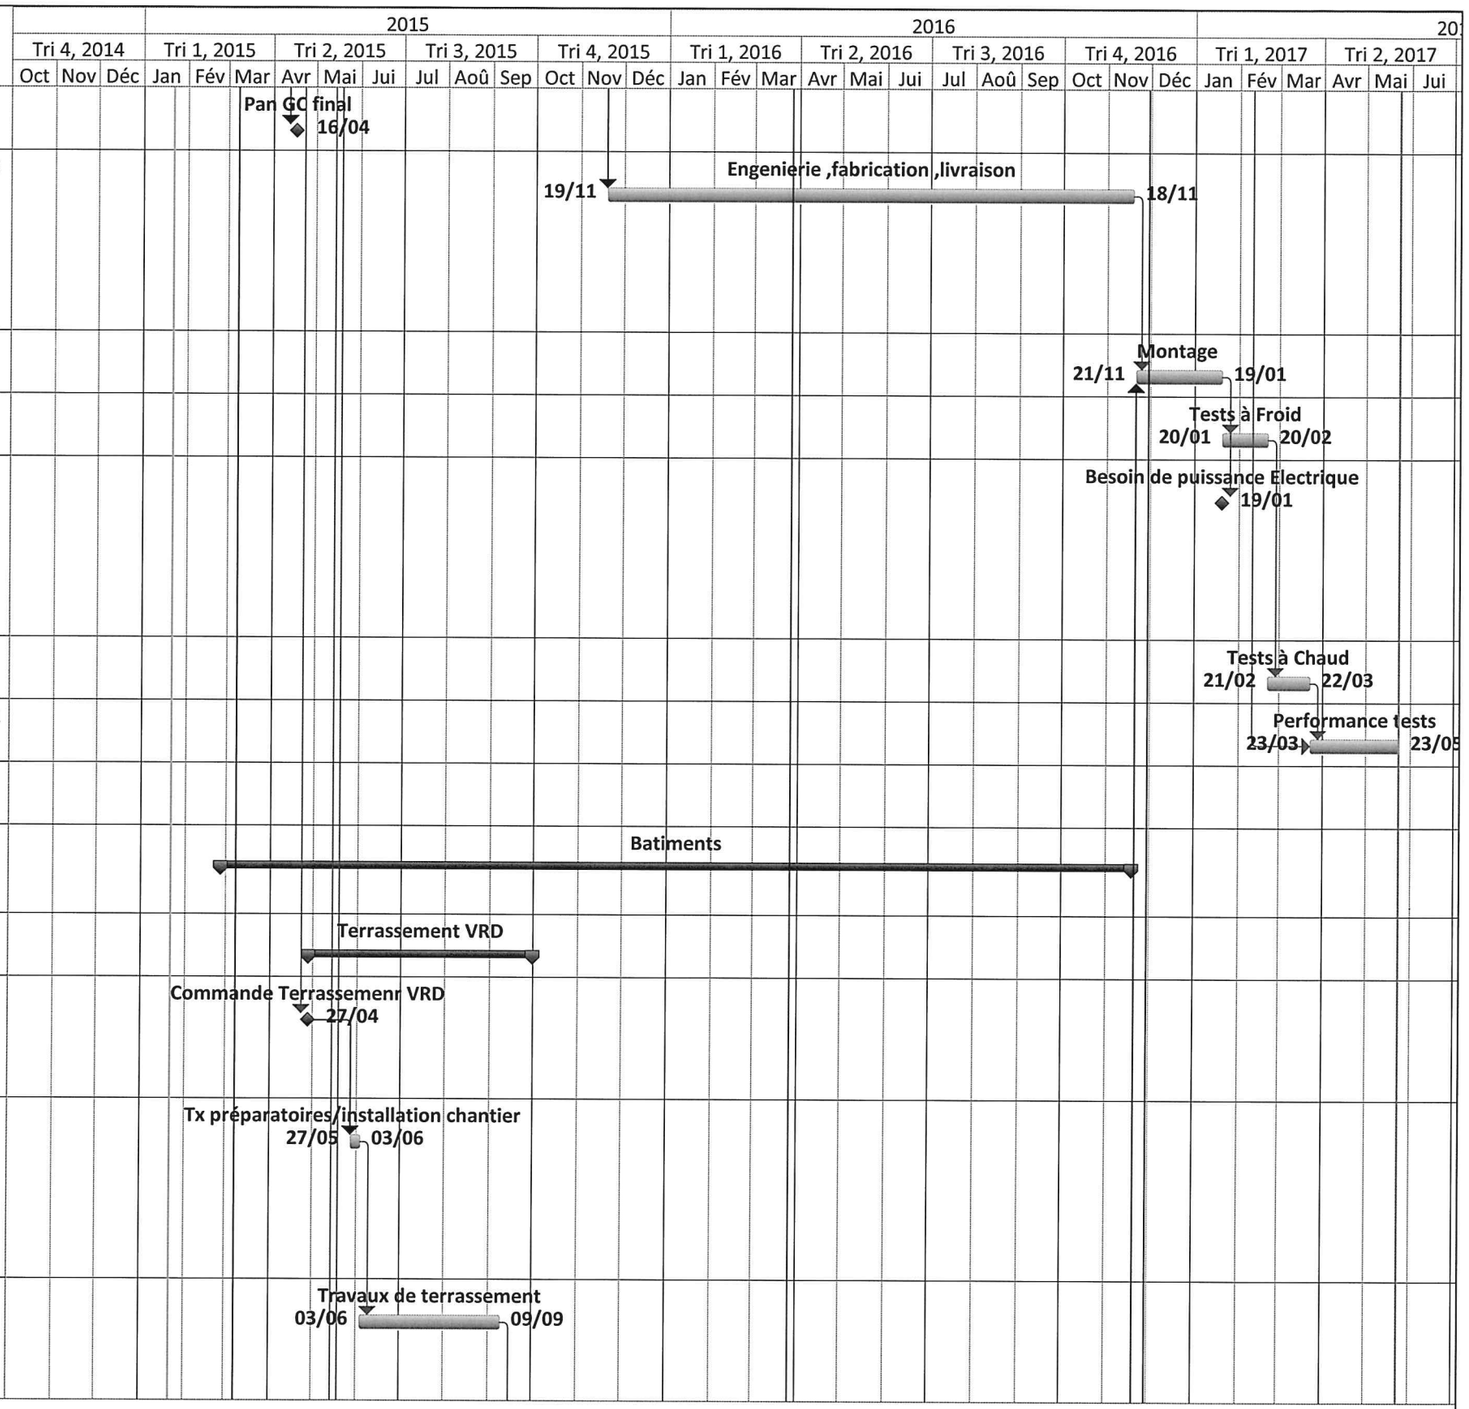

Projet : Projet EcoTitanium avec r
Date : Jeu 22/01/15

Tâche	Tâches externes	Tâche manuelle	Fin uniquement
Fractionnement	Jalons externes	Durée uniquement	Échéance
Jalon	Tâche inactive	Report récapitulatif manuel	Avancement
Récapitulative	Jalon inactif	Récapitulatif manuel	
Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Début uniquement	

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
29		Intempéries	15 jours	Mer 09/09/15	Mer 30/09/15	28
30		***GC***	**53,74 sm**	**Mer 25/02/15**	**Jeu 25/02/16**	
31		Etudes	2 mois	Mer 25/02/15	Mar 28/04/15	4
32		DCE	5 sm	Mar 07/04/15	Lun 11/05/15	31FD-15 jours
33		Consultation alignament GC	8 sm	Lun 11/05/15	Ven 03/07/15	32
34		Commande GC	0 sm	Ven 03/07/15	Ven 03/07/15	33
35		Etudes Exé GC	6 sm	Ven 03/07/15	Jeu 13/08/15	34
36		Travaux GC gros oeuvre	130 jours	Jeu 13/08/15	Jeu 11/02/16	35
37		Intempéries	2 sm	Jeu 11/02/16	Jeu 25/02/16	36
38		Dallages	3 sm	Jeu 28/01/16	Mer 17/02/16	42FD-2 sm
39		***Charpente***	**81,12 sm**	**Lun 18/05/15**	**Ven 18/11/16**	
40		Commande charpente	0 sm	Lun 18/05/15	Lun 18/05/15	2FD+4 mois
41		Etude Exé et fab Charpente	15 sm	Mar 19/05/15	Jeu 27/08/15	40
42		Montage charpente	110 jours	Mer 09/09/15	Mer 10/02/16	41;36DD+4 sm
43						
44		***Electricité Batiment***	**81,12 sm**	**Mar 19/05/15**	**Ven 18/11/16**	

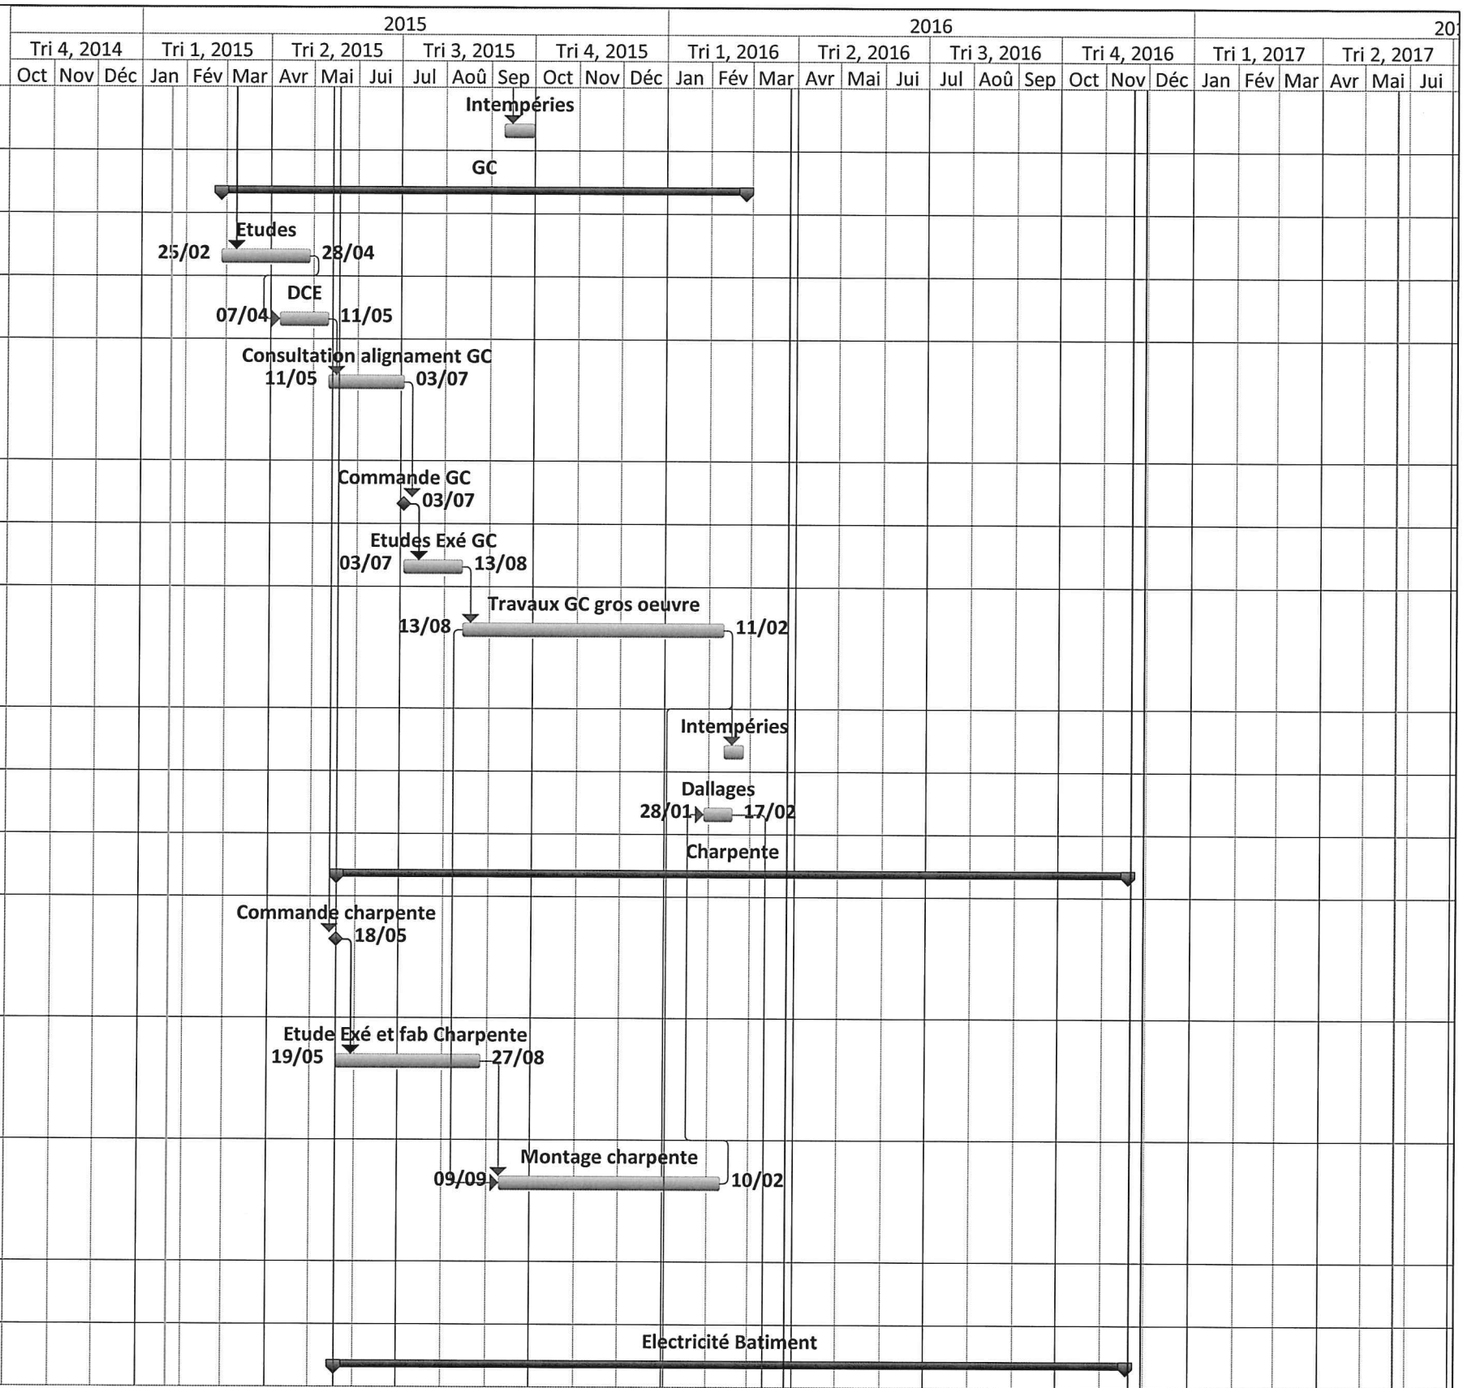

Projet : Projet EcoTitanium avec r
Date : Jeu 22/01/15

Tâche		Tâches externes		Tâche manuelle		Fin uniquement	
Fractionnement		Jalons externes		Durée uniquement		Échéance	
Jalon		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulative		Jalon inactif		Récapitulatif manuel			
Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Début uniquement			
